



# บันทึกข้อความ

E สนอ (เขต) 09/514/2564

สำนักงานชลประทานที่ 2

รับที่ 3

วันที่ - 4 ส.ค. 2565

เวลา 09.06

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๑๙

ที่ สนอ ๙๔๔๗/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
เรียน คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือ ที่ สนอ. ๙๐๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปรายการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าพร้อมปัญหา - อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยการประชุมให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE ณ ที่ตั้ง ตามวัน และเวลาที่กำหนด พร้อมจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดดังเอกสารแนบ ๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ ๒

๒. คณะทำงานที่อยู่ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำไฟล์นำเสนอ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทาง E-mail : hwm.imd@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณฉลจิรา ทองเทพ โทรศัพท์ ๐๘๒ ๗๘๓ ๑๗๗๘ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น

(นายทิวศักดิ์ ชนเดโชพล)  
ร.บ.  
ประธานคณะทำงาน

- สนอ/๑๐ พิก  
- สนอ. ๑๕๓๓๓ สนอ. พ:๑๗ สักร่วมประชุมท.สบ. 2  
ประชุมกองฯ / สักร่วมประชุม สักร่วม 11:30 : สนอ. ๑๕๓๓๓  
- สนอ. ๑๕๓๓๓ สักร่วมประชุม

(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผส.ขบ.๒ 5 ส.ค. 2565

(นางพิรญา ร่มป่าตัน)  
ผท.ขบ.๒

## ผู้เข้าร่วมประชุม

### คณะทำงานฯ :

๑. รธบ. (ประธานฯ)
๒. ผชช.จช.๔ (รองประธานฯ)
๓. ผอ.ผง. (รองประธานฯ)
๔. ผส.บอ. (คณะทำงานฯ)
๕. ผชช.อท.๑ (คณะทำงานฯ)
๖. ผส.พญ. (คณะทำงานฯ)
๗. ผส.สร. (คณะทำงานฯ)
๘. ผส.อส. (คณะทำงานฯ)
๙. ผส.คก. (คณะทำงานฯ)
๑๐. ผอ.พก. (คณะทำงานฯ)
๑๑. ผอ.พต. (คณะทำงานฯ)
๑๒. ผส.มต. (คณะทำงานฯ)
๑๓. ผอ.กตน. (คณะทำงานฯ)
๑๔. ผปบ.บอ. (คณะทำงานฯและเลขานุการฯ)
๑๕. ผผง.ผง. (คณะทำงานฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ)
๑๖. บท.บอ. (คณะทำงานฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ)

### ผู้เกี่ยวข้อง :

๑. ผส.ขป.๒
๒. ผส.ขป.๓
๓. ผส.ขป.๕
๔. ผส.ขป.๖
๕. ผส.ขป.๗
๖. ผส.ขป.๑๓
๗. ผคป.พะเยา
๘. ผคป.เชียงใหม่
๙. ผคป.นครสวรรค์
๑๐. ผคป.พิษณุโลก
๑๑. ผคป.พิจิตร
๑๒. ผคป.สกลนคร
๑๓. ผสภ.๖
๑๔. ผคป.ขอนแก่น
๑๕. ผคป.ชัยภูมิ
๑๖. ผคป.ซีบน
๑๗. ผคป.อุบลราชธานี
๑๘. ผคป.สมุทรสงคราม



# สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ๖๐๓๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน เรื่องการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๗๗๘/๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งข้างต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

## องค์ประกอบ

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   | ประธานคณะทำงาน                  |
| ๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน<br>(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) (ผชช.จช.๔)             | รองประธานคณะทำงาน               |
| ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน  | รองประธานคณะทำงาน               |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   | คณะทำงาน                        |
| ๕. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (ผชช.อท.๑)   | คณะทำงาน                        |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่   | คณะทำงาน                        |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา   | คณะทำงาน                        |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  | คณะทำงาน                        |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล   | คณะทำงาน                        |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  | คณะทำงาน                        |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุ  | คณะทำงาน                        |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน  | คณะทำงาน                        |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน   | คณะทำงาน                        |
| ๑๔. ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา<br>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                  | คณะทำงาน<br>และเลขานุการ        |
| ๑๕. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน<br>กองแผนงาน   | คณะทำงานและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา<br>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | คณะทำงานและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |


อำนาจหน้าที่...



**อำนาจหน้าที่**


๑. ให้ความรู้ด้านวิชาการ ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
  ๒. ติดตามความก้าวหน้ารวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เสนอต่อผู้บริหาร
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประพิศ จันทрма)

อธิบดีกรมชลประทาน



รอง / พิมพ์  
ตรวจ



# 1. รูปแบบการนำเสนอ

## ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ

### การพัฒนา **บึงราชชนก** จังหวัดพิษณุโลก



## บึงราชชนก

### จ.พิษณุโลก

แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟู 4 ด้าน ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 28.85 ล้าน ลน.บ. พื้นที่รับประโยชน์ 3,960 ไร่ บรรเทาพื้นที่อุทกภัย 10,575 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 22,607 ครัวเรือน

แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2571)

วงเงินงบประมาณ 1,456,980,000 บาท



### ลักษณะทั่วไป

- บึงน้ำจัดขนาดใหญ่ พื้นที่ **4,865 ไร่** (ต.สบอแซ อ.เมือง ต.พิบูล ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก)
- หน่วยงานดูแล : กรมเจ้าท่า (ปี 2515)
- หน่วยงานบริหารจัดการน้ำในบึง : กรมชลประทาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ( 11 ก.พ. 64)

### สภาพปัญหา

- ยังไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน
- การดูแลรักษาโดย **ขุดลอกแบบเป็นจุดๆ** ไม่ได้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในลักษณะของบึงแบบดั้งเดิม
- ในฤดูฝนมีน้ำหลากไหลจากพื้นที่รับน้ำและแม่น้ำวังทอง แต่ไม่สามารถไหลเข้าบึงราชชนกได้ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบบึง

### เป้าหมายการพัฒนา

- แหล่งเก็บกักน้ำ
- พื้นที่สูบน้ำการ
- แหล่งพักผ่อนหย่อนใจระดับท้องถิ่น




# แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก

แผนหลักฯ ปี 2563 – 2569 (ม.ค. ครม. 4 มี.ย. 62) มี 4 ด้าน

## 1 การบริหารจัดการ

ปี 62 – 69 วงเงิน 66.20 ล้านบาท

จัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน / บริหารจัดการน้ำ / จัดตั้งองค์กรในการบริหารจัดการบึงฯ



## 2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

ปี 64 – 68 วงเงิน 1,273.82 ล้านบาท

ปรับปรุงทางน้ำเข้าและออก / ขุดลอกบึงฯ / กำหนดขอบเขต โดยยกระดับถนนรอบพื้นที่



## 3 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร

ปี 63 – 66 วงเงิน 63.36 ล้านบาท

ปรับปรุง ขุดลอกคลองและทางน้ำ / สร้างฝายเพื่อยกระดับน้ำให้เข้าสู่บึง



## 4 การจัดการคุณภาพน้ำ/อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ปี 66 – 71 วงเงิน 53.60 ล้านบาท

สร้างการรับรู้ของประชาชนถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำ / การพัฒนาบึงฯ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ



รวม 4 ด้าน 25 โครงการ วงเงิน 1,456.98 ล้านบาท

ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 28.85 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 3,960 ไร่

บรรเทาพื้นที่อุทกภัย 10,575 ไร่ ประชาชนรับประโยชน์ 22,607ครัวเรือน

# แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก (ตามแผนงานหลัก)

## ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

■ แผนการดำเนินการตาม มติ ครม.  
■ ผลการดำเนินการของหน่วยงาน

รายการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาปีที่ดำเนินการ (ปี)					หมายเหตุ	
			63	64	65	66	67		68
1	แผนงานการบริหารจัดการพื้นที่บึงราชนกอย่างยั่งยืนและการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่บึงราชนกโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาสังคม								
1.1	ศึกษารูปแบบและจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการพื้นที่บึงราชนก	จว.พิษณุโลก (พล.)		■					ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	แผนงานการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในพื้นที่บึงราชนก								
2.1	จัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่บึงราชนก	ยผ.							อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2	การแก้ไขปัญหาการบุกรุกเข้าครอบครองและทำประโยชน์ (งานเร่งด่วน)	จว.พล./จท./อบต.วังพิถล	■		■				อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3	สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ	ทสจ./กปม.							อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.4	ศึกษาการรื้อย้ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 KV (งานเร่งด่วน)	กฟผ.							
3	แผนงานการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าและความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่บึงราชนกและพื้นที่โดยรอบ								
3.1	กำหนดเขตปรับปรุงแหล่งรวมพันธุ์ไม้สำคัญ	มน.							อยู่ระหว่างเตรียมการ
3.2	กำหนดเขตเพาะพันธุ์สัตว์น้ำดั้งเดิมในพื้นที่บึงราชนก	มน.							อยู่ระหว่างเตรียมการ
3.3	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ/ลาวโซ่ง	อบต.วังพิถล							อยู่ระหว่างเตรียมการ
4	แผนงานการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บึงราชนกอย่างยั่งยืน								
4.1	ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมให้ชุมชนท้องถิ่น	ทสจ./นทพ./ทน.							อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	แผนงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ เพื่อการควบคุมปริมาณน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ								
5.1	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบึงราชนก (งานเร่งด่วน)	ขป.		■					ดำเนินการแล้วเสร็จ

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 3 โครงการ



# แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก

## ด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงน้ำภาคการเกษตร

■ แผนการดำเนินการตาม มติ ครม.  
■ ผลการดำเนินการของหน่วยงาน

รายการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาปีที่ดำเนินการ (ปี)						หมายเหตุ
			63	64	65	66	67	68	
1	แผนงานเพิ่มศักยภาพการเดิมปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่บึงราชนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและการรักษาระบบนิเวศวิทยา								
1.1	การขุดลอกคลองชักน้ำจากแม่น้ำวังทอง (งานเร่งด่วน)	ขป.		■					อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2	การขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด (งานเร่งด่วน)	ขป.		■	■				ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3	การปรับปรุงและขุดลอกคลองระบายน้ำ (งานเร่งด่วน)	ขป.		■	■				ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.4	การปรับปรุงอาคารระบายน้ำออกจากบึงราชนก (งานเร่งด่วน)	ขป.		■					อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	แผนงานการขุดลอกพื้นที่บึงราชนกอย่างเป็นระบบเพื่อฟื้นฟูเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และกันพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจระดับท้องถิ่น								
2.1	การขุดลอกบึงราชนก (งานเร่งด่วน)	ขป./นทพ/ทบ.		■	■	■	■	■	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2	การปรับปรุงและยกระดับถนนดินโดยรอบพื้นที่บึงราชนก (งานเร่งด่วน)	ทช.		■					อยู่ระหว่างดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ

# แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก

## ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

■ แผนการดำเนินการตาม มติ ครม.  
■ ผลการดำเนินการของหน่วยงาน

รายการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาปีที่ดำเนินการ (ปี)						หมายเหตุ
			63	64	65	66	67	68	
1	แผนงานเพิ่มศักยภาพการเดิมปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่บึงราชนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและการรักษาระบบนิเวศวิทยา								
1.1	การขุดลอกและปรับปรุงคลองสมอแข	ขป.		■		■			ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2	การปรับปรุงและขุดลอกคลองสาธารณะด้านทิศใต้พร้อมอาคารประกอบ (งานเร่งด่วน)	ขป.		■					อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3	การก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ในคลองสมอแข (งานเร่งด่วน)	ขป.		■					อยู่ระหว่างดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ

# แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก

## ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

รายการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาปีที่ดำเนินการ (ปี)						หมายเหตุ
			63	64	65	66	67	68	
1	แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขและลดปัญหามลพิษทางน้ำจากการใช้สารเคมีในพื้นที่โดยรอบพื้นที่บึงราชนก								
1.1	การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย	กสท.							อยู่ระหว่างเตรียมการ
1.2	การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย	มน.							อยู่ระหว่างเตรียมการ
2	แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบนิเวศวิทยาทางน้ำในพื้นที่บึงราชนก								
2.1	การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทสจ.							อยู่ระหว่างเตรียมการ
2.2	โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่บึงราชนก	สสท.3							อยู่ระหว่างเตรียมการ
2.3	โครงการนกกินสาหร่ายน้ำ	ทสจ.							อยู่ระหว่างเตรียมการ
3	แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บึงราชนก								
3.1	การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บึงราชนก	อบจ.พิษณุโลก							อยู่ระหว่างเตรียมการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 โครงการ

■ แผนการดำเนินการตาม มติ ครม.  
■ ผลการดำเนินการของหน่วยงาน

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี้

3.1.1. สรุปผลการติดตามความก้าวหน้า


- สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานหลัก
- สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานกรมชลประทาน

3.1.2. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
- แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) ทุกรายการงาน

3.1.3. สรุปประเด็นปัญหา - อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข

- ปัญหา - อุปสรรค ทุกรายการงาน
- แนวทางแก้ไขทุกรายการงาน ที่เกิดความล่าช้าในแต่ละโครงการ





# ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

## 3.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี้

### 3.1.1. สรุปผลการติดตามความก้าวหน้า

- สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานหลัก
- สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานกรมชลประทาน



## แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก 4 ด้าน (ตามแผนงานหลักทุกหน่วยงาน)

แผนงาน/ผลงาน	วงเงินค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	เฉลี่ย % โครงการ	แผนการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.				หมายเหตุ
			2563	2564	2565	2566 - 2571	
แผนการดำเนินงาน (%)	1,566.54	100	1.24	15.96	33.51	49.28	
แผนสะสมการดำเนินงาน (%)			1.24	17.20	50.72	100	
ผลการดำเนินงาน (%)	192.79	12.31	1.23	11.08	0		
ผลสะสมการดำเนินงาน (%)			1.23	12.31	12.31		

ลำดับ	ประเภทโครงการ	ขนาดโครงการ	วงเงิน ดำเนินการ (ล้านบาท)	เฉลี่ย % โครงการ	แผนการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.										หมายเหตุ		
					2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571			
1	แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่	งบฯ อื่นๆ	61.0	9.6	3,380	3,700	37,000	2,425	4,375	12,975	7,725						
		งบฯ ขาดจ่าย	88.68	8.65	5.17	5.17	5.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก	งบฯ อื่นๆ	1,173.82	87.43	-	391,912	300,000	217,379	131,827	128,076							
		งบฯ ขาดจ่าย	1,244.38	86.10	19,588	238,000	515,000	130,000	740,000								
		งบฯ	191.79	12.30	1,244.38	238,000	515,000	130,000	740,000								
3	แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก	งบฯ อื่นๆ	10.36	4.30	1,273	11,977		16,212									
		งบฯ ขาดจ่าย	190.99	1.38	6.81	6.16		3.38									
		งบฯ	-	-	-	-		16,212									
4	แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก	งบฯ อื่นๆ	10.66	3.68				2,774	3,079	33,931	16,139						
		งบฯ ขาดจ่าย	10.66	3.62				5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	
		งบฯ	-	-				2,769	3,074	33,926	16,134						
รวม		งบฯ อื่นๆ พท	1,684.66	100.00	-	3,600	29,280	21,774	18,300	9,375	18,300	1,138					
		งบฯ ขาดจ่าย พท	1,364,348	100.00	-	1,24	23,56	55,51	29,00	29,00	3,79	1,62					
		งบฯ พท	191.79	12.31	-	1,24	14,88	55,71	9,74	9,74	9,74	1,62					
		งบฯ พท	-	-	-	1,24	14,88	55,71	9,74	9,74	9,74	1,62					

### ผลการดำเนินงาน

- แผนการสะสมดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 50.72
- ผลการสะสมดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 12.31
- ช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 38.41



# แผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก (ตามแผนงานกรมชลประทานกรมชลประทาน)

แผนงาน/ผลงาน	วงเงินค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	เฉลี่ย % โครงการ	แผนการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ.				หมายเหตุ
			2563	2564	2565	2566 - 2571	
แผนการดำเนินงาน (%)	1,269.50	100	1.54	19.69	37.81	40.96	
แผนสะสมการดำเนินงาน (%)			1.54	21.23	59.04	100	
ผลการดำเนินงาน (%)	192.79	15.19	1.51	13.67	0		
ผลสะสมการดำเนินงาน (%)			1.51	15.19	15.19		

แผนการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2563-2571 (รวมแผนงาน)

แผนการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2563-2571 (รวมแผนงาน)

ลำดับ	ประเภท	โครงการ	ปีงบประมาณ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	แผนการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ.						หมายเหตุ	
												2563	2564	2565	2566	2567	2568		
1	แผนการดำเนินงาน	1.5 แผนการดำเนินงาน...	1.00	งบ	20.00	1.50													
2	แผนการดำเนินงาน	2.1 แผนการดำเนินงาน...	4.00	งบ	194.50	15.71													
2	แผนการดำเนินงาน	2.2 แผนการดำเนินงาน...	37.37	งบ	998.00	74.83													
2	แผนการดำเนินงาน	2.3 แผนการดำเนินงาน...	1.00	งบ	100.00	7.00													
รวม					1,269.50	100													
รวม					192.79	15.19													

## ผลการดำเนินงาน

- แผนการสะสมดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 59.04
- ผลการสะสมดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 15.19
- ช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 43.85

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 3.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี้

#### 3.1.2. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
- แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) ทุกรายการงาน

#### 3.1.3. สรุปประเด็นปัญหา - อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข

- ปัญหา - อุปสรรค ทุกรายการงาน
- แนวทางแก้ไขทุกรายการงาน ที่เกิดความล่าช้าในแต่ละโครงการ



# แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) (ตัวอย่าง)

งบประมาณ 236.17 ล้านบาท (ในงบเงินกู้ปี 2564) (จัดทำทุกรายการงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับ	กิจกรรม	งบ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ประจำปี 2564		ผลการ ดำเนินการ เร็ว/ช้า	สถานะภาพการดำเนินงาน
			เป้า	ผล		
2.2.1	โครงการขุดลอก บึงราชนก โชน 1	137.7008	ปริมาณดินขุด 2.778 ล้าน ลบ.ม. (100%)	ปริมาณดินขุด 1.825 ล้าน ลบ.ม. (65.69%)	ช้ากว่าแผน 34.31%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณดินขุดคงเหลือ 0.953 ล้าน ลบ.ม.
	โครงการขุดลอก บึงราชนก โชน 2	98.474	ปริมาณดินขุด 1.947 ล้าน ลบ.ม. (100%)	ปริมาณดินขุด 1.485 ล้าน ลบ.ม. (76.27%)	ช้ากว่าแผน 23.73%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณดินขุดคงเหลือ 0.462 ล้าน ลบ.ม.



ปัญหา-อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการขุดลอกบึงราชนกโชน 1 และ โชน 2 ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน โคนเอนทำให้บริเวณพื้นที่ทำการขุดลอก ไม่สามารถดำเนินงานได้ในระยะเวลา ประมาณ 2 เดือน เนื่องจากมีน้ำท่วมเต็มพื้นที่ดำเนินงาน	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม 1 เดือน เพื่อชดเชยเวลาช่วงที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในระหว่างน้ำท่วมพื้นที่ขุดลอก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 65

# แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) (ตัวอย่างของแผนพัฒนาหนองหาร)

งบประมาณ 538.249 ล้านบาท (ในงบพรบ.ปี 2565) (จัดทำทุกรายการงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ลำดับ	กิจกรรม	งบ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.						สถานะภาพการดำเนินงาน
			2564		2565		2566 -2569		
			เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
2.2	โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าพร้อมระบบ ส่งน้ำ รอบหนองหาร จำนวน 32 สถานี	1,055.22	1 แห่ง 22 ล้านบาท (ในงบกลุ่ม จังหวัดปี 64)	1 แห่ง 22 ล้านบาท (100%) ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2 แห่ง 79.58 ล้านบาท (ในงบ พรบ. ปี 65)	2 แห่ง 6.75 ล้านบาท (8.48 %) ช้ากว่าแผน 16.51 % จาก แผนเดือน ธ.ค. 64 (24.99 %)	29 แห่ง 953.64 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานีบ้านน้ำพุ : อยู่ขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บ้านให้ชาวบ้านรับทราบ คาดการณ์ว่าจะดำเนินการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565</li> <li>- สถานีสูบน้ำบ้านแก : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างและเคลียพื้นที่ก่อสร้าง คาดการณ์ว่าจะดำเนินการก่อสร้างเดือนมกราคม 2565</li> </ul>	

แผนที่แสดงตำแหน่งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 32 แห่ง



ปัญหา-อุปสรรค	แนวทางแก้ไข



## ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

\*หากข้อมูลใด ที่สำคัญต้องนำเสนอเพื่อพิจารณาสามารถนำเสนอได้เช่น

- ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี
- แผนงานโครงการดำเนินการ (แสดงตำแหน่งโครงการ)
- การดำเนินการการจัดการที่ดิน

ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการเดินทางมา  
ตรวจราชการ "โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ.....เมื่อวันที่....."


### ตัวอย่าง การนำเสนอ รายงานข้อสั่งการ (ถ้ามี)

ที่	ข้อสั่งการโครงการฟื้นฟูประชาชน	ความก้าวหน้าของผลการดำเนินการ
1	เร่งรัดขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด	- ดำเนินการโดยกรมชลประทาน (คบ.แควน้อย) ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563
2	เร่งรัดสำรวจ ออกแบบ การปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปี 2563	- ดำเนินการโดยกรมชลประทาน (สขป. 3) ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563
3	บริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานเติมน้ำในบึง	- ดำเนินการโดย กรมชลประทาน - การบริหารจัดการน้ำเพื่อเติมน้ำให้กับบึง ผ่านทาง อาคาร บังคับน้ำหลัก จำนวน 22 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพในการเติมน้ำรวม 28.15 ลบ.ม./วินาที
4	บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำตามผลการสำรวจออกแบบของกรมชลประทาน	- ดำเนินการโดย สทนช. - รอผลการออกแบบของกรมชลประทาน





# 1.แผนงานโครงการดำเนินการ

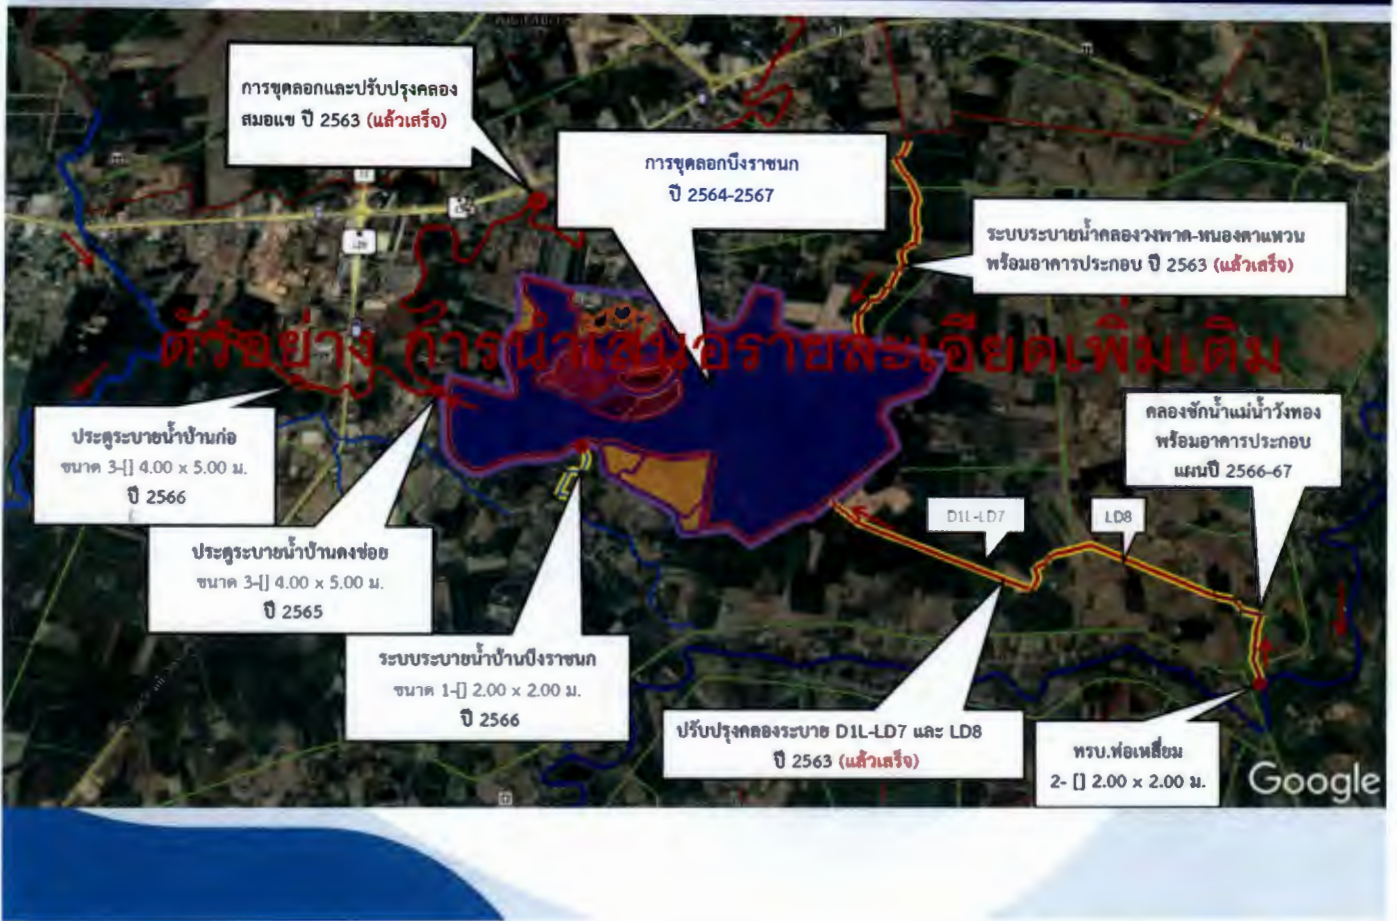

# 2.การขุดลอกบึง 6 โชน ดำเนินการปี 2564-68





## 4.การดำเนินการจัดการที่ดิน

การจัดการที่ดินภายในบึงราชนก

### ตัวอย่าง การนำเสนอ การจัดการที่ดิน



#### การขุดลอกตะกอนดินบึงราชนก

กองดิน 5.33 ล้าน ลบ.ม. ในการขุดโซนที่ 1 และ 2  
จำแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. บริจาคเพื่อสาธารณะ 3.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. ประมูลขาย 1 ล้านลูกบาศก์เมตร
3. ส่วนที่เหลือ 1.33 ล้าน ลบ.ม. ยผ.จังหวัดพิษณุโลก  
ออกแบบ ภูมิทัศน์เชิงนิเวศต่อไป

จบการนำเสนอ



ระเบียบวาระการประชุม

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ในวันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

กรมชลประทาน สามเสน

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
- ๒.๒ สรุปการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี้
  - ๓.๑.๑. สรุปผลการติดตามความก้าวหน้า
    - สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานหลัก
    - สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานกรมชลประทาน
  - ๓.๑.๒. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปี
    - แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
    - แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) ทุกรายการงาน
  - ๓.๑.๓. สรุปประเด็นปัญหา - อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข
    - ปัญหา - อุปสรรค ทุกรายการงาน
    - แนวทางแก้ไขทุกรายการงาน ที่เกิดความล่าช้าในแต่ละโครงการ

โดยลำดับการนำเสนอ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาเวียงหนองล่อง จังหวัดเชียงราย สขป. ๒  
(นำเสนอ โดย ผศป.เชียงราย)
๒. โครงการพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา สขป. ๒  
(นำเสนอ โดย ผศป.พะเยา)
๓. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา สขป. ๒  
(นำเสนอ โดย ผศป.พะเยา)
๔. โครงการพัฒนาบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก สขป. ๓  
(นำเสนอ โดย ผศป.พิษณุโลก)
๕. โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ สขป. ๓  
(นำเสนอ โดย ผศป.นครสวรรค์)
๖. โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร จังหวัดพิจิตร สขป. ๓  
(นำเสนอ โดย ผศป.พิจิตร)

๗. โครงการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร สขป. ๕  
(นำเสนอ โดย ผคป.สกลนคร)
๘. โครงการพัฒนาแก่งน้ำต้อน จังหวัดขอนแก่น สขป. ๖  
(นำเสนอ โดย ผคป.ขอนแก่น)
๙. โครงการพัฒนาแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น สขป. ๖  
(นำเสนอ โดย ผคป.ขอนแก่น)
๑๐. โครงการพัฒนาบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ สขป. ๖  
(นำเสนอ โดย ผคป.ชัยภูมิ)
๑๑. โครงการพัฒนาหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี สขป. ๗  
(นำเสนอ โดย ผคป.อุบลราชธานี)
๑๒. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม สขป. ๑๓  
(นำเสนอ โดย ผคป.สมุทรสงคราม)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
