

รายงานการประชุมโครงการชลประทานน่าน  
ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔  
วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานน่าน

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑. นายนิพนธ์	ฟูศรี	ผคป.น่าน
๒. นายโชติกรวิเศษ	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๓. นายจักริน	เมืองดี	สบ.๑ คป.น่าน
๔. นายอัศวินท์	เกียรติยศ	สบ.๒ คป.น่าน
๕. นายรพีพงศ์	ลภัสภักคณุตม์	สบ.๓ คป.น่าน
๖. นายพรศักดิ์	เสียวสระคู	สบ.๔ คป.น่าน
๗. นางปราณี	วุฒิชา	บท.คป.น่าน
๘. นางเตือนใจ	ยศศิริพันธุ์	พด.คป.น่าน
๙. นางทิวพร	แก้วกาหลง	บง.คป.น่าน
๑๐. นายเพลิน	สุกใส	ชก.คป.น่าน
๑๑. นางเครือมาศ	เจียรศักดิ์กุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒. ว่าที่ ร.ต. สัญญา	ปาจิณะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

นายสมบัติ	แบ่งมูล	จน.คป.น่าน อบรม นบก. รุ่นที่ ๙๕
-----------	---------	------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ สิ้นไตรมาส ๒ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
- ๑.๒ ข้อเสนอของสำนักบริหาร ส่วนอุทกวิทยา เรื่อง การกำจัดวัชพืช ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) บท.คป.น่าน

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานบริหารได้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขแล้ว  
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ในการประชุมให้นำเสนอในรูปแบบ Power Point และแจกเอกสารในที่ประชุมด้วย)

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม (วศ.คป.น่าน)

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี/กันขยาย ปี ๒๕๖๓

เงินกันทั้งหมด ๙,๐๔๓,๒๙๑.๔๖ บาท เบิกจ่าย ๘,๕๘๐,๗๓๔.๗๗ บาท ร้อยละ ๙๔.๘๙ %

๑. โครงการฝายบ้านสบปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกัน จำนวน ๖,๔๐๙,๓๓๖.๗๗ บาท เบิกจ่าย ๖,๓๙๗,๕๖๒.๗๐ บาท ร้อยละ ๙๙.๘๒ % ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย ๖ รายการ เงินกัน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๐๒๖,๘๙๓.๗๑ บาท ร้อยละ ๙๗.๗๙ % ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ฝ่ายท่อน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต เงินกัน ๑,๓๖๔,๖๗๖.๔๒ บาท เบิกจ่าย ๙๓๗,๐๒๖.๐๕ บาท ร้อยละ ๖๘.๖๖ %

๔. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินกัน ๒๑๙,๒๗๘.๒๗ บาท เบิกจ่าย ๒๑๙,๒๕๒.๓๑ บาท ร้อยละ ๙๙.๙๙ %

**หมายเหตุ - รายการที่ ๓ เบิกจ่ายทั้งหมดและส่งคืนแล้ว แต่ในระบบยังไม่ตัด**

**งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม**

เงินกันทั้งหมด ๑๓,๓๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๙๖๖,๓๒๔.๔๖ บาท คงเหลือ ๔,๓๙๗,๐๗๕.๕๔ บาท ร้อยละ ๖๗.๑๐ %

๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแล เงินกัน ๔๐๗,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐๗,๓๘๕.๐๔ บาท คงเหลือ ๑๔.๙๖ บาท ร้อยละ ๑๐๐ % คืบ ๑๔.๙๖

๒. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจำ เงินกัน ๓,๙๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๓๘๒,๑๘๑.๖๖ บาท คงเหลือ ๕๗๓,๘๑๘.๓๔ บาท ร้อยละ ๘๕.๔๙ % คืบ ๕๗๓,๖๘๒.๕๗ บาท

๓. ฝ่ายห้วยขาบใหม่ เงินกัน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๑๗๖,๗๕๗.๗๖ บาท คงเหลือ ๓,๘๒๓,๒๔๒.๒๔ บาท ร้อยละ ๕๗.๕๒ % คืบ ๑,๖๓๓,๘๒๔.๓๔ บาท

**ศูนย์เครื่องจักรกล เงินกันปี ๒๕๖๓**

๑. โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำ (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง) เงินกัน ๖,๕๑๑,๓๓๗.๖๕ บาท เบิกจ่าย ๘๐๔,๓๒๙.๖๐ บาท คงเหลือ ๕,๗๐๖,๐๐๘.๐๕ บาท ร้อยละ ๑๒.๓๖ % มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ โดยให้มีการเตรียมหน้างานแล้ว

๒. การดำเนินโครงการขุดลอกเพื่อเตรียมการรับมือ ๒๒ รายการ เงินกัน ๓๗,๒๒๐,๑๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑,๖๑๔,๕๗๓.๖๕ บาท คงเหลือ ๑๕,๖๐๕,๕๒๖.๓๕ บาท ร้อยละ ๕๘.๐๗ %

**รวมงบประมาณทั้งสิ้น** ๔๓,๗๓๑,๔๓๗.๖๕ บาท เบิกจ่าย ๒๒,๔๑๙,๓๐๓.๒๕ บาท คงเหลือ ๒๑,๓๑๒,๑๓๔.๔๐ บาท ร้อยละ ๕๑.๒๗ %

**ผคป.น่าน :** ขอให้ สบ.๓ คป.น่าน ติดตามเรื่องขอขยายกัน งานฝ่ายห้วยขาบใหม่ โดยงบกลางแจ้งคืนไปหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ตัดออกจากระบบให้นำมาปรับแก้ ทำเป็นระบบส่งน้ำ

**ผคป.น่าน :** รายการที่ ๕ การดำเนินโครงการขุดลอกเพื่อเตรียมการรับมือ ๒๒ รายการ มอบหมายงานการเงิน ประสาน รถขุดเชียงใหม่ แจ้งไม่ขอขยายกัน

: รายการที่ ๔ โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำ (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง) ทำเรื่องขอขยายกัน

**งบประมาณตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔**

**แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

**การจัดการน้ำชลประทาน** เงินงบประมาณที่ได้ ๓,๒๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑,๖๖๐,๒๗๖.๐๘ บาท คงเหลือ ๑,๖๒๙,๑๒๓.๙๒ บาท ผลเบิกจ่าย ๕๐.๔๗ %

๑. งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ๗.๓ กม. เงินงบประมาณที่ได้ ๖๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๐๑,๙๘๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓๗,๔๒๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๔๗.๒๓ %

๒. งานบำรุงรักษาหัวงาน ๓๙๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๑๓,๔๐๗.๘๐ บาท คงเหลือ ๘๘๖,๕๙๒.๒๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๕๕.๖๗ %

๓. งานบริหารการส่งน้ำ ๔๔,๘๘๒ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๙,๖๙๐.๖๘ บาท คงเหลือ ๑๙๐,๓๐๙.๓๒ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๖.๕๖ %

๔. งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ๑๑๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓๕,๑๙๗.๖๐ บาท คงเหลือ ๒๑๔,๘๐๒.๔๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๘.๖๓ %

**ผศ.ป.น่าน :** รายการที่ ๔ งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ๑๐๐ ไร่ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

#### **แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

**โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** เงินงบประมาณที่ได้ ๓๖,๑๐๐,๔๘๒.๓๑ บาท เบิกจ่าย ๒๔,๑๗๘,๗๑๖.๘๓ บาท คงเหลือ ๑๑,๙๒๑,๗๖๕.๔๘ บาท ผลเบิกจ่าย ๖๖.๙๘ %

๑. งานซ่อมแซมระบบชลประทาน ๓๖ รายการ เงินงบประมาณที่ได้ ๓๓,๕๙๐,๕๖๕.๓๑ บาท เบิกจ่าย ๒๔,๑๗๘,๗๑๖.๘๓ บาท คงเหลือ ๙,๔๑๑,๘๔๘.๔๘ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๑.๙๘ % ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด เงินงบประมาณที่ได้ ๒,๔๙๙,๙๑๗.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒,๔๙๙,๙๑๗.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ % (งานจ้างเหมา)
๓. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินงบประมาณที่ได้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ % (งานจ้างเหมา)

#### **แผนงาน บูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค**

**โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เงินงบประมาณที่ได้ ๗๗,๖๖๔,๗๔๐.๒๔ บาท เบิกจ่าย ๕,๔๔๕,๒๖๓.๓๐ บาท คงเหลือ ๗๒,๒๑๙,๔๗๖.๙๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๗.๐๑ %

๑. ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง เงินงบประมาณที่ได้ ๑๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่งาม ๑,๐๐๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๑๐,๘๗๖,๗๒๒.๕๓ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๐,๘๗๖,๗๒๒.๕๓ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ % (งานจ้างเหมา)
๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตึกใหม่ ๒,๕๐๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๑๘,๑๑๓,๐๘๔.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๘,๑๑๓,๐๘๔.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ % (จ้างเหมา)
๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำบัว ๒,๐๐๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๔๗,๘๘๘,๖๕๖.๒๔ บาท เบิกจ่าย ๕,๔๔๕,๒๖๓.๓๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๔๔๓,๓๙๒.๙๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๑.๓๗ %
๕. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าหุง เงินงบประมาณที่ได้ ๑๐,๘๔๐,๘๔๖.๗๒ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๐,๘๔๐,๘๔๖.๗๒ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %

#### **แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ**

**โครงการปรับปรุงงานชลประทาน** เงินงบประมาณที่ได้ ๓๔,๘๒๐,๙๒๔.๘๔ บาท เบิกจ่าย ๒๑,๐๙๗,๔๑๐.๖๔ บาท คงเหลือ ๑๓,๗๒๓,๕๑๔.๒๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๖๐.๕๙ %

๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสา LMC เงินงบประมาณที่ได้ ๖,๓๙๑,๐๙๔.๔๗ บาท เบิกจ่าย ๕,๗๖๑,๑๔๘.๖๗ บาท คงเหลือ ๖๒๙,๙๔๕.๘๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๐.๑๔ %
๒. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพองและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) ระยะที่ ๒ เงินงบประมาณที่ได้ ๓,๖๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๙๑,๙๓๐.๖๑ บาท คงเหลือ ๒,๔๖๑,๘๖๙.๓๙ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๒.๖๒ %
๓. ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน ๔ สาย เงินงบประมาณที่ได้ ๑๑,๐๒๗,๒๗๙.๑๓ บาท เบิกจ่าย ๘,๒๖๐,๗๒๙.๘๗ บาท คงเหลือ ๒,๗๖๖,๕๔๙.๒๖ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๔.๙๑ %
๔. ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ระยะที่ ๒ เงินงบประมาณที่ได้ ๑๓,๗๘๘,๗๕๑.๒๔ บาท เบิกจ่าย ๕,๘๘๓,๖๐๑.๔๙ บาท คงเหลือ ๗,๙๐๕,๑๔๙.๗๕ บาท ผลเบิกจ่าย ๔๒.๗๙ %

**โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน** เงินงบประมาณที่ได้ ๗,๐๘๓,๕๕๗.๒๕ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๐๗,๖๖๘.๓๑ บาท คงเหลือ ๕,๘๗๕,๘๘๘.๙๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๗.๐๕ %

- ฝ่ายห้วยแสด ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูง) เงินงบประมาณที่ได้ ๗,๐๘๓,๕๕๗.๒๕ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๐๗,๖๖๘.๓๑ บาท คงเหลือ ๕,๘๗๕,๘๘๘.๙๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๗.๐๕ %

#### **แผนพัฒนาจังหวัด ปิงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร** เงินงบประมาณที่ได้ ๔๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๓๖๒,๕๕๔.๒๖ บาท คงเหลือ ๓๓,๑๓๗,๔๔๕.๗๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๒๐.๑๕ %

๑. ซ่อมแซมฝายป่าแดด พร้อมระบบส่งน้ำ เงินงบประมาณที่ได้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๙๙,๓๒๓.๖๐ บาท คงเหลือ ๖๗๖.๔๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๙๕ %
๒. ซ่อมแซมฝายน้ำแม่ฮวน พร้อมระบบส่งน้ำ เงินงบประมาณที่ได้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๗๖,๕๓๖.๗๙ บาท คงเหลือ ๑,๒๒๓,๔๖๓.๒๑ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๘.๘๒ %
๓. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านพื้เหนือ (ฝายพริกหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๗๖,๓๗๐.๘๑ บาท คงเหลือ ๔,๕๒๓,๖๒๙.๑๙ บาท ผลเบิกจ่าย ๒๔.๖๑ %
๔. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านดอนไชย (ฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๘๒๗,๙๖๐.๒๒ บาท คงเหลือ ๑๒,๑๗๒,๐๓๙.๗๘ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๘.๘๕ %
๕. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบซุ่น (บ้านดอยตัว) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๗๘๒,๓๖๒.๘๔ บาท คงเหลือ ๑๕,๒๑๗,๖๓๗.๑๖ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๐.๔๘ %

**กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร** เงินงบประมาณที่ได้ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๕๖๖,๑๐๘.๓๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๔๓๓,๘๙๑.๗๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๐.๖๙%

๑. จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านผาหลัก (ฝายห้วยน้ำบอนพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๙๗,๐๐๕.๔๙ บาท คงเหลือ ๑๐,๘๐๒,๙๙๔.๕๑ บาท ผลเบิกจ่าย ๙.๙๘ %
๒. จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบซุ่น (ฝายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๓๖๙,๑๐๒.๘๑ บาท คงเหลือ ๑๐,๖๓๐,๘๙๗.๑๙ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๑.๔๑ %

### **๓.๒ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.น่าน)**

#### **งานบริหารจัดการน้ำ**


#### **รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำน่าน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)**

- สถานี N.๖๔ บ้านผาขวาง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระดับตลิ่ง ๐.๕๐ ม.(รสม.) ความจุลำน้ำ ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที  
ศูนย์เสาระดับ +๒๑๐.๙๐๐ ม.(รทก.) เปอร์เซ็นปริมาณน้ำ ๐.๒๓๖ %
- สถานี N.๑ สะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมือง จ.น่าน ระดับตลิ่ง -๐.๔๐ ม.(รสม.) ความจุลำน้ำ ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที  
ศูนย์เสาระดับ +๑๙๒.๒๐๐ ม.(รทก.) เปอร์เซ็นปริมาณน้ำ ๐.๑๙๖ %
- สถานี N.๑๓A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน ระดับตลิ่ง -๐.๑๙ ม.(รสม.) ความจุลำน้ำ ๒๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที  
ศูนย์เสาระดับ +๑๗๗.๔๐๐ ม.(รทก.) เปอร์เซ็นปริมาณน้ำ ๑.๓๗๕ %


**สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔**

ความจรรวม ๔๓.๕๖๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบันรวม ๑๙.๑๑๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๓.๘๘ %  
 อ่างน้ำแหวง คิดเป็น ๓๔.๕๐ %  
 อ่างฯห้วยแฮต คิดเป็น ๑๙.๕๓ %  
 อ่างน้ำฝาง คิดเป็น ๓๗.๐๘ %  
 อ่างน้ำฮี คิดเป็น ๕๓.๔๖ %  
 อ่างน้ำริม คิดเป็น ๖๗.๗๗ %  
 อ่างฯขนาดเล็ก พรต. จำนวน ๒๙ แห่ง คิดเป็น ๕๑.๓๒ %

**การบริหารจัดการน้ำ จังหวัดน่าน**

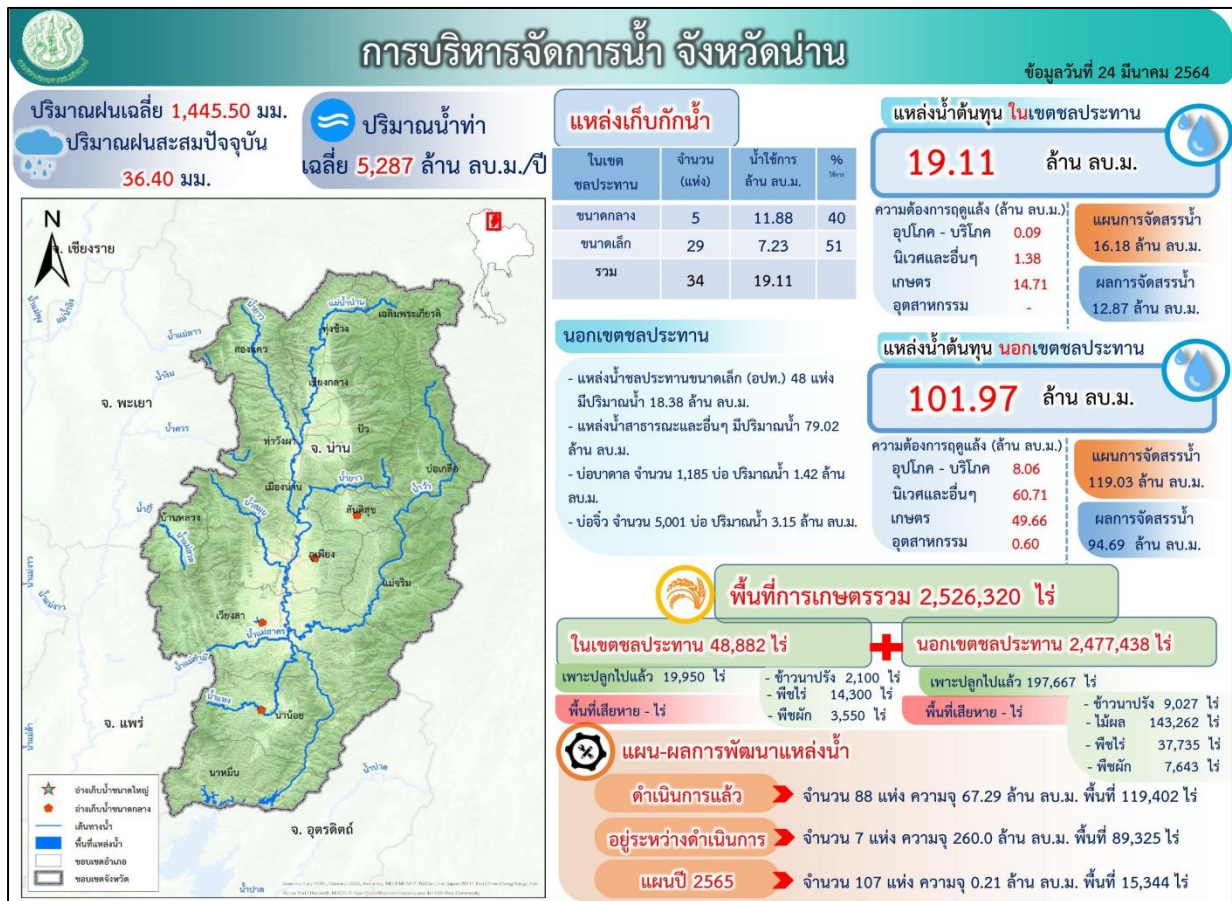


การบริหารจัดการน้ำ จังหวัดน่าน



## การบริหารจัดการน้ำ จังหวัดน่าน

ข้อมูลวันที่ 24 มีนาคม 2564

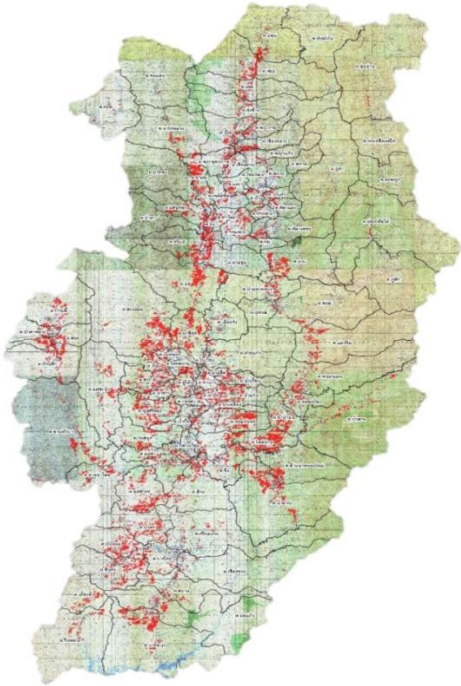

**พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก**

	ในเขต	นอกเขต	รวม	
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย	-	53,905	53,905	ไร่
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง	-	110,578	110,578	ไร่
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก	-	221,586	221,586	ไร่

**พื้นที่เสี่ยงน้ำแล้งด้านอุปโภคบริโภคในเขตชลประทาน**  
 (โดยการวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)  
 ได้แก่ กปภ.สาขาน่าน ทั้งนี้ ขป. และ กปภ. ได้วางแผนเตรียมมาตรการรองรับแล้ว

ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง

**มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือ**

- ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ไว้ให้ความช่วยเหลือ
  - เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๘" 11 เครื่อง
  - รถบรรทุกน้ำ 2 คัน
  - รถบรรทุกติดเครน 2 คัน

**แผนการจ้างแรงงานเกษตรจำนวน 67 รายการ**

	<b>วงเงินการจ้าง</b>		<b>วงเงินการจ้าง</b>
แผน	83,383,230 บาท	ผล	4,622,955.45 บาท
	จำนวน		จำนวน
	1,496 คน		417 คน

การบริหารจัดการน้ำ จังหวัดน่าน

**พื้นที่เสี่ยงปัญหาภัยแล้ง**

จังหวัดน่านประสบปัญหาภัยแล้งเป็นบริเวณกว้างพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับจังหวัดน่านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ระหว่างหุบเขา ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยและเกษตรกรรม การกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรเป็นไปได้ค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน และมีแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอ จึงเป็นปัญหาตามมาคือภาวะแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำ

**พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย**

จังหวัดน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ โดยมีเนื้อที่ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดมีความลาดชันเกินกว่า ๓๐ องศา และยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน โดยมีความเสี่ยงอุทกภัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน เป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพลำน้ำของแม่น้ำน่าน มีความลาดชันค่อนข้างมาก ทำให้เมื่อเกิดฝนตกทางตอนบนของจังหวัด และมีปริมาณฝนตกสะสมเกิน ๘๐ มม./วัน จะทำให้เกิดสภาวะเสี่ยงดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและชุมชน

**โดยมีความเสี่ยงระดับมาก**

**๓.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ งบประมาณปี ๒๕๖๓ และเงินกู้ยืมปี (บง.คป.น่าน)**

**บง.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

**รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔**

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๐,๙๙๐,๒๔๖.๖๔ บาท เบิกจ่าย ๕๗,๒๖๓,๗๘๗.๐๗ บาท คิดเป็น ๓๓.๕๙ %

**เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓**

กั้เงินไว้ จำนวน ๙,๘๑๓,๘๐๙.๔๙ บาท สั้คืนเงินกั้ ๗๗๐,๕๑๘.๐๓ บาท จำนวนเงิน ๙,๐๔๓,๒๙๑.๔๖ บาท เบิกจ่าย ๘,๕๗๖,๘๐๖.๒๔ บาท คิดเป็น ๙๔.๘๔ %

**โดยแยกเป็น**

๑. การจัดการน้ำชลประทาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓,๒๘๙,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๗๑๐,๑๗๖.๐๘ บาท คิดเป็น ๕๑.๙๙ %
๒. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๕๗๑,๕๐๐ บาท สั้คืน ๑,๗๕๐,๕๗๕.๑๖ บาท เบิกจ่าย ๒๓,๑๒๖,๒๖๖.๖๔ บาท ยอดคงเหลือ ๓๔,๘๒๐,๙๒๔.๘๔ บาท คิดเป็น ๖๖.๔๑ %
๓. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๘,๗๗๙,๘๐๐ บาท สั้คืน ๑,๖๙๖,๒๔๒.๗๕ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๐๗,๖๖๘.๓๑ บาท ยอดคงเหลือ ๗,๐๘๓,๕๕๗.๒๕ บาท คิดเป็น ๑๗.๐๕ %
๔. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๘๘,๔๙๑,๘๖๗.๒๔ บาท เบิกจ่าย ๕,๘๘๖,๙๐๑.๑๐ บาท คิดเป็น ๖.๖๕ %
๕. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๑๐๐,๔๘๒.๓๑ บาท เบิกจ่าย ๒๔,๔๔๔,๗๑๘.๘๓ บาท คิดเป็น ๖๗.๗๑ %

**งบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๔**

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๗๘,๘๖๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๔๐๐,๘๗๑.๙๗ บาท คิดเป็น ๒๕.๘๗ %

**๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป (บท.คป.น่าน)**

**บท.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

- ไม่มีรายงานในที่ประชุม

**๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ (พต.คป.น่าน)**

**พต.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

- ไม่มีรายงานในที่ประชุม

**๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายช่างกล (ชก.คป.น่าน)**

**ชก.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

**รายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลางเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓**

- รวมการใช้น้ำมันดีเซล เดือน ก.พ. ๖๔ จำนวนที่ใช้ ๓,๒๓๑ ลิตร เดือน ม.ค. ๖๔ จำนวนที่ใช้ ๓,๕๕๒ ลิตร **ลดลง ๓๒๑ ลิตร**
- รวมการใช้น้ำมันเบนซิน เดือน ก.พ. ๖๔ จำนวนที่ใช้ ๓๔ ลิตร เดือน ม.ค. ๖ จำนวนที่ใช้ ๒๖ ลิตร **เพิ่มขึ้น ๘ ลิตร**
- รวมการใช้พลังงานไฟฟ้า เดือน ก.พ. ๖๔ จำนวนที่ใช้ ๙,๒๖๓.๗๙ หน่วย เดือน ม.ค. ๖๔ จำนวนที่ใช้ ๘,๑๖๑.๒๗ หน่วย **เพิ่มขึ้น ๑,๑๐๒.๕๒ หน่วย**

### ๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สบ. ๑ - ๔ คบ.น่าน

- งานบริหารจัดการน้ำ
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานต่างๆ

#### **สบ.๑ คบ.น่าน : แจ่งให้ที่ประชุม**

##### **งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

##### **งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

๑. งานฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
เงินงวด ๑,๓๖๔,๖๗๖.๔๒ บาท เบิกจ่าย ๙๓๗,๐๒๖.๐๕ บาท คงเหลือ ๔๒๗,๖๕๐.๓๗ บาท ผลการ  
เบิกจ่าย ๖๘.๖๖ % คืบเงิน ๔๒๗,๖๕๐.๓๗ บาท
- งานจ้างเหมาดินชุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้ายระยะทางไม่เกิน ๑ กม. ซึ่งเกินอายุสัญญา ๙๘ วัน ผู้รับจ้าง  
ได้ส่งงานเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓
๒. ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งท้ายคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๙๘,๘๕๕.๔๑  
บาท คงเหลือ ๑,๑๔๔.๕๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๗๑ % (โอนกลับ)

##### **งบจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)**

##### **งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

#### **ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแล ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน**

ได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ซึ่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งแผนโดยไม่ระบุวันเวลา และได้เชิญผู้รับจ้าง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้ น้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทาง จะ  
ดำเนินงานก่อนการดำเนินงาน ซึ่งจะมีการรายงานทุกสัปดาห์ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแล

##### **งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

##### **แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ**

##### **ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน**

- ฝายห้วยแฮต ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน พื้นที่รับประโยชน์  
๑๐๐ ไร่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๗,๐๘๓,๕๕๗.๒๕ บาท  
เบิกจ่าย ๑,๒๐๗,๖๖๘.๓๑ บาท คงเหลือ ๕,๘๗๕,๘๘๘.๙๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗.๐๕ %

##### **แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

๑. ซ่อมแซมหัวงานและคลองส่งน้ำฝายบ้านตอง (พรต.) ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  
(งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๒๒,๙๕๔.๓๐ บาท คงเหลือ ๖๒,๐๔๕.๗๐ บาท  
ผลการเบิกจ่าย ๙๓.๗๐ %
๒. ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหะ พร้อมอาคารประกอบ (พรต.) ตำบลเมืองจาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
(งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๐๒,๖๕๕.๙๕ บาท คงเหลือ ๒๗,๓๔๔.๐๕ บาท  
ผลการเบิกจ่าย ๙๗.๐๖ %
๓. ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
(งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๑๙,๘๔๖.๒๐ บาท คงเหลือ ๗๐,๑๕๓.๘๐ บาท  
ผลการเบิกจ่าย ๘๒.๐๑ %



๔. ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑๒,๐๙๒.๘๐ บาท คงเหลือ ๖๗,๙๐๗.๒๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๕.๗๕ %
๕. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายก้อ (พรต.) ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๙๑,๖๙๖.๑๒ บาท คงเหลือ ๕๘,๓๐๓.๘๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๔.๔๗ %
๖. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองสายที่ ๒ อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๔๘,๓๒๖.๖๐ บาท คงเหลือ ๑,๖๗๓.๔๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๘๒ %
๗. ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียน (พรต.) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลน้ำเกียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๔๖,๙๙๕.๓๖ บาท คงเหลือ ๑๘๓,๐๐๔.๖๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๔.๙๓ %
๘. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด โครงการชลประทานน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๒,๔๙๙,๙๑๗.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒,๔๙๙,๙๑๗.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐.๐๐ % เริ่มดำเนินการเดือน มี.ค. ๖๔

### สบ.๒ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

#### งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

#### งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ซ่อมแซมเนื่องจากอุทกภัย) มีทั้งหมดจำนวน ๕ รายการ

๑. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๑L-LMC กม.๒+๔๐๐ ฝายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๒. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๑L-LMC กม.๓+๒๐๐ ฝายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๓. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๒L-LMC กม.๒+๑๕๙ ฝายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๔. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๒L-LMC กม.๒+๓๗๙ ฝายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๕. ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC กม.๔+๐๔๓ ฝายสา	๒๕๐,๐๐๐	บาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. ๖๓ ทั้งหมด

#### งบจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

#### งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- งานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจำ วงเงินงบประมาณตาม พรบ. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินได้รับจัดสรร (หักคืนเงินแล้ว) ๓,๙๕๖,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการประกาศแผนทั้งหมดแล้ว

#### งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ซ่อมแซมหินเรียงฝายน้ำแขวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง วงเงินงบประมาณ ๒,๔๖๖,๒๘๒.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๘๕๐,๖๕๐.๐๕ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๕.๐๔ % คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ผลเบิกจ่าย ๑๐๐ %
๒. ซ่อมแซม Gate Valve อาคารควบคุมอ่างเก็บน้ำน้ำแหวง โครงการชลประทานน่าน วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๓๒,๑๓๔.๐๐ บาท คงเหลือ ๖๑๕,๖๓๑.๙๕ บาท ผลเบิกจ่าย ๘๖.๔๓ %

๓. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.๒+๖๕๒ ถึง กม.๒+๙๕๒ โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๘๗๔,๐๘๙.๙๓ บาท เบิกจ่าย ๓๙๓,๑๘๗.๙๓ บาท คงเหลือ ๔๘๐,๙๐๒.๐๐ บาท  
ผลเบิกจ่าย ๔๔.๙๘ %
๔. ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำ คลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๗+๕๕๕ โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๒๔๙,๔๙๑.๐๐ บาท (จ้างเหมา) เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒๔๙,๔๙๑.๐๐ บาท  
ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๕. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสา กม.๒+๗๘๖ ถึง กม.๒+๘๘๖ โครงการชลประทานน่าน วงเงิน  
งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๕๙,๒๑๘.๗๘ บาท คงเหลือ ๑๖๐,๗๘๑.๒๒ บาท ผลเบิกจ่าย  
๖๑.๗๒ %
๖. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๓+๙๘๐ ถึง กม.๔+๒๘๐ โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๕๗๗,๐๔๓.๐๐ บาท (จ้างเหมา) เบิกจ่าย ๕๗๗,๐๔๓.๐๐ บาท คงเหลือ  
๕๗๗,๐๔๓.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๗. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.๑+๒๖๒ ถึง กม.๑+๓๖๒ โครงการชลประทานน่าน วงเงิน  
งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๕๒,๕๗๖.๑๐ บาท คงเหลือ ๑๖๗,๔๒๓.๙๐ บาท  
ผลเบิกจ่าย ๖๐.๑๔ %
๘. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๖+๕๗๕ ถึง กม.๖+๘๒๕ โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (จ้างเหมา) เบิกจ่าย ๕๘๔,๗๒๒.๐๐ บาท คงเหลือ ๕๘๔,๗๒๒.๐๐ บาท  
ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๙. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.๓+๕๐๐ ถึง กม.๓+๖๐๐ โครงการชลประทานน่าน วงเงิน  
งบประมาณ ๔๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๖๙,๐๙๒.๔๒ บาท คงเหลือ ๑๖๖,๓๐๗.๕๘ บาท ผลเบิกจ่าย  
๖๑.๘๐ %
๑๐. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๑+๙๐๐ ถึง กม.๒+๑๕๐ โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๖๔๕,๘๐๗.๐๐ บาท (จ้างเหมา) เบิกจ่าย ๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๖๓๔,๗๐๗.๐๐ บาท  
ผลเบิกจ่าย ๑.๗๒ %
๑๑. ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC ฝ่ายสา กม.๑+๑๓๐ โครงการชลประทานน่าน วงเงิน  
งบประมาณ ๑๔๙,๘๔๒.๔๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔๙,๘๔๒.๔๐ บาท คงเหลือ - บาท ผลเบิกจ่าย ๑๐๐.๐๐ %
๑๒. ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC ฝ่ายสา จำนวน ๙ แห่ง โครงการชลประทานน่าน วงเงิน  
งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒๑,๘๕๗.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๙,๑๔๓.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย  
๘๐.๗๐ %
๑๓. ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝ่ายสา LMC โครงการชลประทานน่าน วงเงินงบประมาณ ๖,๓๙๑,๐๙๔.๔๗ บาท  
เบิกจ่าย ๕,๗๖๑.๑๔๘.๖๗.๐๐ บาท คงเหลือ ๖๒๙,๙๔๕.๘๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๐.๑๔ %
๑๔. ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝ่ายสา จำนวน ๔ สาย (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๑๑,๐๒๗,๒๗๙.๑๓ บาท เบิกจ่าย ๘,๒๖๐,๗๒๙.๘๗ บาท คงเหลือ ๒,๗๖๖,๕๔๙.๒๖  
บาท ผลเบิกจ่าย ๗๔.๙๑ %
๑๕. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าหุ้ง พื้นที่ชลประทาน ๗๐๐ ไร่ วงเงินงบประมาณ  
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จ้างก่อสร้าง) เบิกจ่าย ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %

**สบ.๓ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม****งบจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓****งบการดำเนินการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ**

- ฝ่ายห้วยขาบใหม่ ตำบลคงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณตาม พรบ. ๙,๐๐๐,๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๑๗๖,๗๕๗.๗๖ บาท คงเหลือ ๓,๘๒๓,๒๔๒.๒๔ บาท ร้อยละ ๕๗.๕๒ % คืบ ๑,๖๓๓,๘๒๔.๓๔ บาท

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔****แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาคโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๐๐ %

**สถานะ**

อยู่ระหว่างรอ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่นอนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

**แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๑ โครงการ**

- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) ระยะที่ ๒ โครงการชลประทานน่าน วงเงินงบประมาณ ๓,๖๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๙๑,๙๓๐.๖๑ บาท คงเหลือ ๒,๔๖๑,๘๖๙.๓๙ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๒.๖๒ %

**แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม****โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔ โครงการ**

๑. ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (พรต.) วงเงินงบประมาณ ๓,๑๕๙,๗๓๕.๙๖ บาท เบิกจ่าย ๒,๓๓๙,๘๐๓.๒๑ บาท คงเหลือ ๘๑๙,๙๓๒.๗๕ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๔.๐๕ %
๒. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบัว กม.๐+๔๐๐ ถึง กม.๑+๐๐๐ (พรต.) วงเงินงบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๗๙,๖๓๔.๕๒ บาท คงเหลือ ๓๖๕.๔๘ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๙๖ %
๓. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำให้โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน ตามพระราชดำริ (พรต.) วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๓๔,๒๔๘.๘๐ บาท คงเหลือ ๒๖๕,๗๕๑.๒๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๘๒.๒๘ % **คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม**
๔. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำพง กม.๑+๕๐๐ ถึง กม.๑+๘๐๐ (ขนาดกลาง พรต.) วงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๔๙,๙๐๙.๘๘ บาท คงเหลือ ๙๐.๑๒ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๙๙ %

**แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม****โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๖ โครงการ**

๑. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ท่อลอด) ฝ่ายน้ำยาง (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๙๙,๖๔๐.๗๒ บาท คงเหลือ ๓๕๙.๒๘ บาทผลเบิกจ่าย ๙๙.๙๑ %
๒. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และอาคารประกอบ ฝ่ายน้ำปัว (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๙๙,๗๕๖.๔๗ บาท คงเหลือ ๒๔๓.๕๓ บาทผลเบิกจ่าย ๙๙.๙๘ %
๓. ซ่อมแซมตลิ่งหัวงานฝายน้ำยาง (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน วงเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๔๙,๘๑๑.๐๔ บาท คงเหลือ ๑๘๘.๙๖ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๙๖ %

๔. ซ่อมแซมอาคารป้องกันกักตุนน้ำฝายและอาคารประกอบฝายน้ำปัว (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๘๔,๓๐๖.๔๔ บาท คงเหลือ ๓๑๕,๖๙๓.๕๖ บาท  
ผลเบิกจ่าย ๗๘.๙๕ %
๕. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายน้ำย่าง กม.๐+๑๐๐ ถึง กม.๐+๓๐๐ (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน  
วงเงินงบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๗๙,๔๒๐.๙๙ บาท คงเหลือ ๕๗๙.๐๑ บาท ผลเบิกจ่าย  
๙๙.๙๔ %
๖. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายสบยอ (พมพ.) โครงการชลประทานน่าน วงเงินงบประมาณ ๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท  
เบิกจ่าย ๙๑๘,๑๘๕.๕๖ บาท คงเหลือ ๗,๘๑๔.๔๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๑๖ %

#### **สบ.๔ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

#### **งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

#### **แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๕ โครงการ**

๑. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำสวด (ปชต.) วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการเอง) เบิกจ่าย  
๙๑๘,๑๘๕.๕๖ บาท คงเหลือ ๗,๘๑๔.๔๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๑๖ %
๒. ซ่อมแซมหัวงานฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ้ำเวียงแก วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการเอง)  
เบิกจ่าย ๙๑๘,๑๘๕.๕๖ บาท คงเหลือ ๗,๘๑๔.๔๔ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๑๖ %
๓. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยป่าซาง วงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการเอง) เบิกจ่าย  
๙๔๕,๙๓๖.๑๙ บาท คงเหลือ ๔,๐๖๓.๘๑ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๕๗ %
๔. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำว่า วงเงินงบประมาณ ๑,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ดำเนินการเอง) เบิกจ่าย  
๑,๑๔๕,๙๕๖.๕๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๔๓.๕๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๙.๘๒ %
๕. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านถ้ำเวียงแก (บ้านน้ำพัน) วงเงินงบประมาณ ๑,๑๓๙,๖๐๓.๐๐ บาท (จ้างเหมา)  
เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑,๑๓๙,๖๐๓.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %

#### **แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค**

#### **ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตี๊ดใหม่ พื้นที่ชลประทาน ๒,๕๐๐ ไร่ วงเงินงบประมาณ  
๑๘,๑๑๓,๐๘๔.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๘,๑๑๓,๐๘๔.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐ %

#### **ที่ประชุมรับทราบ**

#### **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

สบ.๓ คป.น่าน : เสนอในที่ประชุม การศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี ในเรื่องกำหนดการเดินทาง  
และแบบเสื้อ มอบหมายให้ สบ.๒ คป.น่าน และสบ.๓ คป.น่าน ดำเนินการร่วมกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวเฉลิมขวัญ สิริยศ)

ผู้ตรวจรายงานงานการประชุม  
(นางปราณี วุฒิชยา)  
บท.คป.น่าน

เรียน ผคป.น่าน  
เพื่อโปรดทราบ

(นางปราณี วุฒิชยา)  
บท.คป.น่าน

ทราบ

(นายนิพนธ์ พุศรี)  
ผคป.น่าน
